ГРАФИК РЕМОНТА ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ

Document date: 07Июн08
HB Line: 07Июн08

Строка	ID работы	Название работы	Сроки	Длит.
1	**FLAT**	**Ремонт квартиры**	**16Июн08 16Авг08**	**45d**
2	**FLAT.W**	**Ремонт санузла**	**16Июн08 01Июл08**	**11d**
3	FLAT.W.0	Начало ремонта санузла	16Июн08 16Июн08	0
4	FLAT.W.1	Снятие сантехприборов	16Июн08 17Июн08	2d
5	FLAT.W.2	Снятие обшивки, плитки, обналички дверей	16Июн08 17Июн08	2d
6	FLAT.W.5	Штрабление стен, прокладка электрики, заделка штраб	18Июн08 18Июн08	1d
7	FLAT.W.4	Подготовка поверхности	19Июн08 19Июн08	1d
8	FLAT.W.11	Монтаж разводки	18Июн08 19Июн08	2d
9	FLAT.W.10	Укладка плитки на пол	20Июн08 21Июн08	2d
10	FLAT.W.8	Установка ванны	22Июн08 22Июн08	1d
11	FLAT.W.100	Укладка плитки на стену	23Июн08 26Июн08	4d
12	FLAT.W.7	Монтаж сантехприборов	27Июн08 28Июн08	2d
13	FLAT.W.9	Монтаж потолков	29Июн08 30Июн08	2d
14	FLAT.W.12	Окончание ремонта санузла	01Июл08 01Июл08	0
15	**FLAT.S**	**Ремонт спальни**	**01Июл08 13Июл08**	**9d**
16	FLAT.S.0	Начало ремонта спальни	01Июл08 01Июл08	0
17	FLAT.S.1	Снятие обоев	01Июл08 02Июл08	2d
18	FLAT.S.2	Снятие паркетной планки и плинтуса, обналички дверей	01Июл08 02Июл08	2d
19	FLAT.S.5	Штрабление стен, прокладка электрики, заделка штраб	03Июл08 03Июл08	1d
20	FLAT.S.4	Укладка ГВЛ на пол	03Июл08 04Июл08	2d
21	FLAT.S.3	Выравнивание углов стен	05Июл08 06Июл08	2d
22	FLAT.S.7	Шпатлевка потолков	05Июл08 06Июл08	2d
23	FLAT.S.8	Покраска потолков, радиаторов	07Июл08 08Июл08	2d
24	FLAT.S.6	Грунтовка пола	09Июл08 09Июл08	1d
25	FLAT.S.9	Поклейка стен обоями	09Июл08 10Июл08	2d
26	FLAT.S.11	Установка электроприборов	11Июл08 11Июл08	1d
27	FLAT.S.10	Укладка подложки и ламината, плинтуса	11Июл08 12Июл08	2d
28	FLAT.S.12	Окончание ремонта спальни	13Июл08 13Июл08	0
29	**FLAT.T**	**Ремонт комнаты**	**13Июл08 25Июл08**	**9d**
30	FLAT.T.0	Начало ремонта комнаты	13Июл08 13Июл08	0
31	FLAT.T.1	Снятие обоев	13Июл08 14Июл08	2d
32	FLAT.T.2	Снятие паркетной планки и плинтуса, обналички дверей	13Июл08 14Июл08	2d
33	FLAT.T.5	Штрабление стен, прокладка электрики, заделка штраб	15Июл08 15Июл08	1d
34	FLAT.T.4	Укладка ГВЛ на пол	15Июл08 16Июл08	2d
35	FLAT.T.3	Выравнивание углов стен, зашивка стен ГКЛ	17Июл08 18Июл08	2d
36	FLAT.T.7	Шпатлевка потолков	17Июл08 18Июл08	2d
37	FLAT.T.8	Покраска потолков, радиаторов	19Июл08 20Июл08	2d
38	FLAT.T.6	Грунтовка пола	21Июл08 21Июл08	1d
39	FLAT.T.9	Поклейка стен обоями	21Июл08 22Июл08	2d
40	FLAT.T.11	Установка электроприборов	23Июл08 23Июл08	1d
41	FLAT.T.10	Укладка подложки и ламината, плинтуса	23Июл08 24Июл08	2d
42	FLAT.T.12	Окончание ремонта комнаты	25Июл08 25Июл08	0
43	**FLAT.U**	**Ремонт кухни**	**13Июл08 30Июл08**	**12d**
44	FLAT.U.0	Начало ремонта кухни	13Июл08 13Июл08	0
45	FLAT.U.1	Снятие обоев, снятие плитки	13Июл08 14Июл08	2d
46	FLAT.U.2	Снятие паркетной планки и плинтуса, обналички дверей	13Июл08 14Июл08	2d

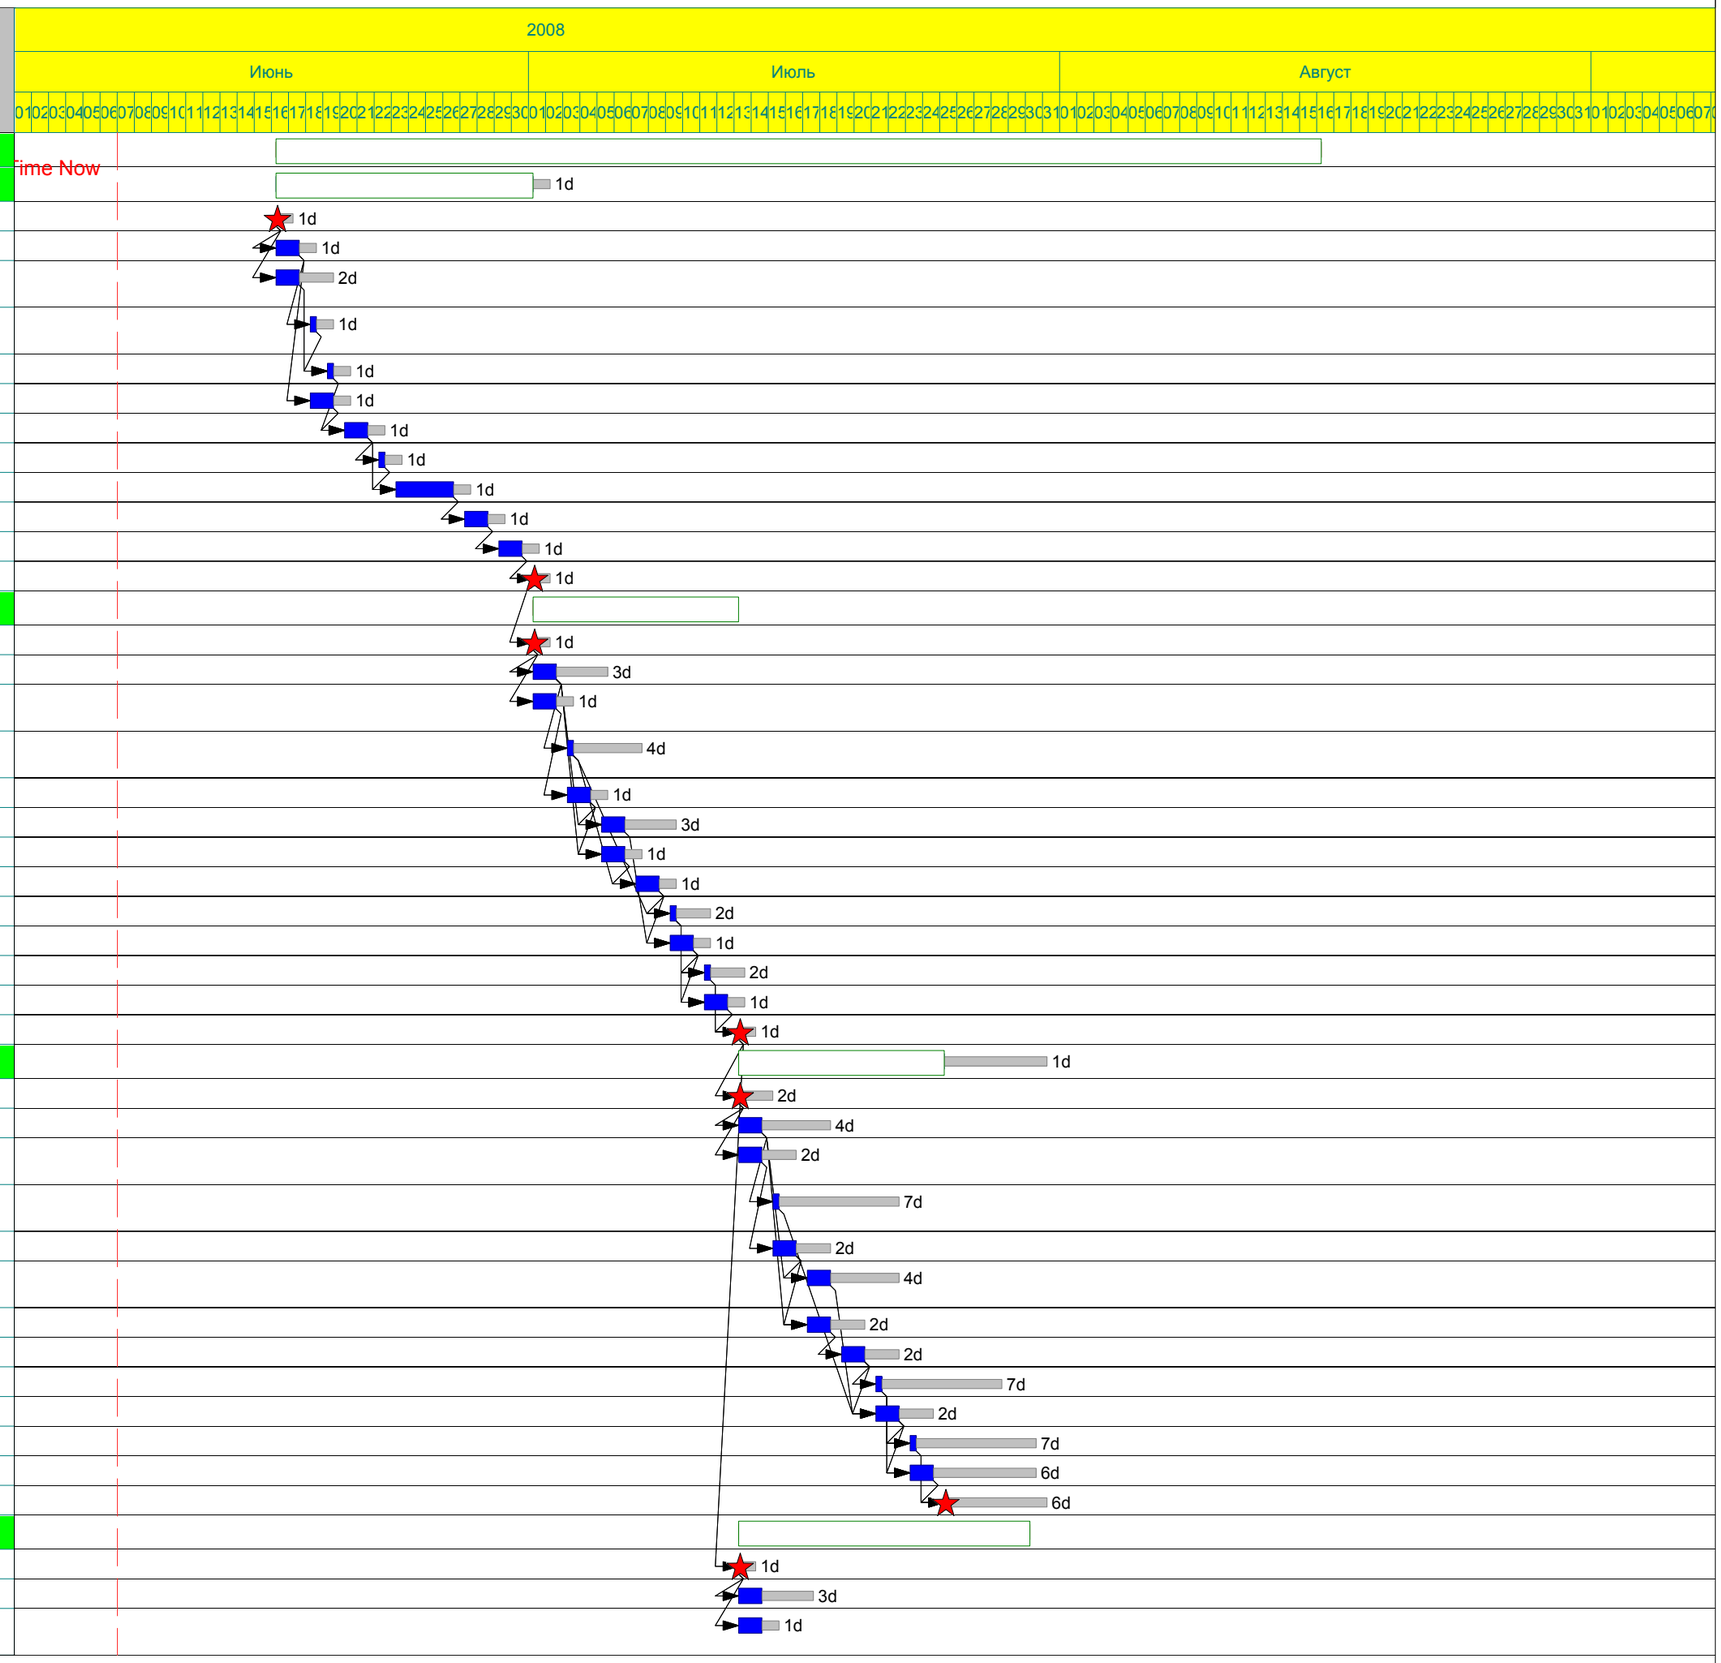

ГРАФИК РЕМОНТА ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ

Document date: 07Июн08
HB Line: 07Июн08
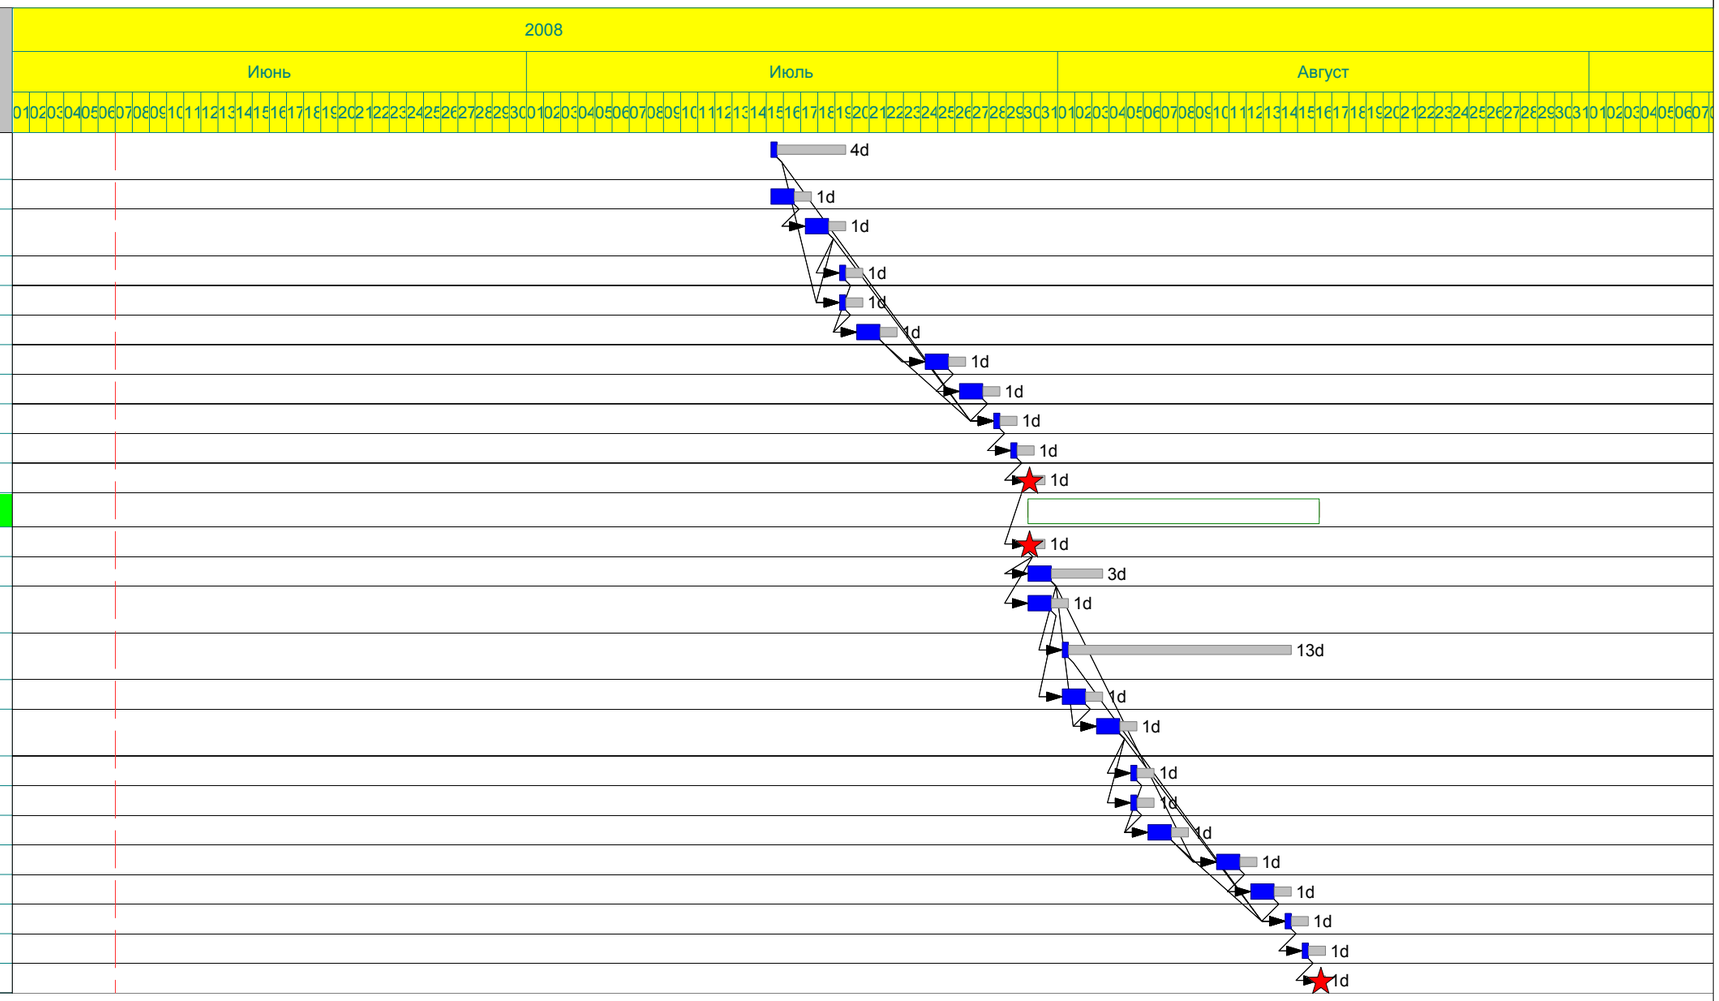
Строка	ID работы	Название работы	Сроки	Длит.
47	FLAT.U.5	Штрабление стен, прокладка электрики, заделка штраб	15Июл08 15Июл08	1d
48	FLAT.U.4	Укладка ГВЛ на пол	15Июл08 16Июл08	2d
49	FLAT.U.3	Выравнивание углов стен, зашивка стен ГКЛ	17Июл08 18Июл08	2d
50	FLAT.U.6	Грунтовка пола	19Июл08 19Июл08	1d
51	FLAT.U.100	Укладка плитки на стену	19Июл08 19Июл08	1d
52	FLAT.U.10	Укладка плитки на пол	20Июл08 21Июл08	2d
53	FLAT.U.7	Шпатлевка потолков	24Июл08 25Июл08	2d
54	FLAT.U.8	Покраска потолков, радиаторов	26Июл08 27Июл08	2d
55	FLAT.U.9	Поклейка стен обоями	28Июл08 28Июл08	1d
56	FLAT.U.11	Установка электроприборов	29Июл08 29Июл08	1d
57	FLAT.U.12	Окончание ремонта кухни	30Июл08 30Июл08	0
58	**FLAT.Y**	**Ремонт коридора**	**30Июл08 16Авг08**	**13d**
59	FLAT.Y.0	Начало ремонта коридора	30Июл08 30Июл08	0
60	FLAT.Y.1	Снятие обоев	30Июл08 31Июл08	2d
61	FLAT.Y.2	Снятие паркетной планки и плинтуса, обналички дверей	30Июл08 31Июл08	2d
62	FLAT.Y.5	Штрабление стен, прокладка электрики, заделка штраб	01Авг08 01Авг08	1d
63	FLAT.Y.4	Укладка ГВЛ на пол	01Авг08 02Авг08	2d
64	FLAT.Y.3	Выравнивание углов стен, зашивка стен ГКЛ	03Авг08 04Авг08	2d
65	FLAT.Y.6	Грунтовка пола	05Авг08 05Авг08	1d
66	FLAT.Y.100	Укладка плитки на стену	05Авг08 05Авг08	1d
67	FLAT.Y.10	Укладка плитки на пол	06Авг08 07Авг08	2d
68	FLAT.Y.7	Шпатлевка потолков	10Авг08 11Авг08	2d
69	FLAT.Y.8	Покраска потолков	12Авг08 13Авг08	2d
70	FLAT.Y.9	Поклейка стен обоями	14Авг08 14Авг08	1d
71	FLAT.Y.11	Установка электроприборов	15Авг08 15Авг08	1d
72	FLAT.Y.12	Окончание ремонта коридора	16Авг08 16Авг08	0
